



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno

Stato di avanzamento 2013 - *sintesi*

Attività gennaio/dicembre 2013

Ecco le principali tappe che hanno segnato il periodo:

- Proroga della Convenzione
- Avanzamento delle progettazioni preliminari – riepilogo attività
- Avanzamento delle progettazioni preliminari per appalto integrato – riepilogo attività
- Avanzamento delle progettazioni definitive – riepilogo attività
- Finanziamento delle opere
- Bandi di gara
- Avanzamento dell'intervento per la realizzazione della nuova sede del Museo dell'Aquila
- Progetti Pilota

Proroga della Convenzione

Il 17 ottobre 2013 la Convenzione tra il MiBACT ed Invitalia per l'attuazione del «Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno», integrata ed estesa con Atto Aggiuntivo del 2 dicembre 2009 , è stata prorogata fino al **31 dicembre 2014**.

La proroga del Progetto consente di concludere – a risorse invariate – le ultime attività programmate nel 2013.

Avanzamento delle progettazioni preliminari – riepilogo attività

Nel 2013 è stata completata la procedura di verifica dei progetti preliminari da parte dei Responsabili Unici di Procedimento.

| Attività | Polo | n. interventi progettati | Valore degli interventi progettati (euro) * |
|--|----------------------|--------------------------|---|
| Progettazione preliminare conclusa e verificata dal RUP | Melfi-Venosa | 12 | 4.900.000 |
| | Napoli-MANN | 15 | 98.800.000 |
| | Sibari | 10 | 23.000.000 |
| | Taranto | 26 | 17.900.000 |
| | Palermo | 23 | 10.850.000 |
| | Metaponto | 26 | 14.900.000 |
| | Locri | 17 | 3.200.000 |
| | Ragusa-Siracusa | 40 | 26.000.000 |
| | Trapani | 16 | 14.000.000 |
| | Castel del Monte | 11 | 3.000.000 |
| | Sassari-Porto Torres | 5 | 27.300.000 |
| | Totale | 201 | 243.850.000 |

* Valore da quadro economico.

Avanzamento delle progettazioni preliminari per appalto integrato – riepilogo attività

| Attività | Polo | n. interventi progettati | Valore degli interventi progettati (euro) * |
|--|-----------------|--------------------------|---|
| Progettazione preliminare per appalto integrato conclusa e verificata dal RUP | Ragusa-Siracusa | 30 | 22.300.000 |
| | Trapani | 5 | 10.200.000 |
| | Totale | 35 | 32.500.000,00 |

* Valore da quadro economico.

Avanzamento delle progettazioni definitive – riepilogo attività

| Attività | Polo | n. interventi progettati | valore degli interventi progettati (euro) * |
|--|------------------|--------------------------|---|
| Progettazione definitiva conclusa | Melfi-Venosa | 11 | 4.000.000 |
| | L'Aquila | 3 | 5.000.000 |
| | Sibari | 26 | 18.000.000 |
| | Taranto | 17 | 9.500.000 |
| | Palermo | 29 | 13.500.000 |
| | Napoli-MANN | 5 | 14.500.000 |
| | Castel del Monte | 11 | 3.000.000 |
| | Locri | 39 | 13.750.000 |
| | Trapani | 10 | 5.760.000 |
| | Ragusa-Siracusa | 9 | 3.700.000 |
| | Totale | | 160 |

* Valore da quadro economico.

Finanziamento delle opere 1/2

Attraverso atti di finanziamento e atti di riprogrammazione, è stato possibile portare alla fase di realizzazione la maggior parte dei progetti elaborati.

In particolare, attraverso le risorse del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR 2007-2013), le risorse del Piano di Azione Coesione per il Mezzogiorno (PAC) e specifici finanziamenti del CIPE (Delibera del 23 marzo 2012), il «Parco Progetti» realizzato nell’ambito del Progetto pilota è stato finanziato per euro 85.650.000,00.

Finanziamento delle opere 2/2

| POLO MUSEALE | Opere oggetto del livello finale di progettazione (euro)* | Stanziamiento CIPE (euro) | Stanziamiento POIN/PAC (euro) | PROGETTO PILOTA POLI MUSEALI DI ECCELLENZA (euro) | Fonti di finanziamento attivate (euro) CIPE; POIN/PAC; PROGETTO POLI MUSEALI |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| PALERMO | 13.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | | 6.500.000 |
| SIRACUSA - RAGUSA | 26.000.000 | | 26.000.000 | | 26.000.000 |
| TRAPANI | 15.960.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 |
| CASTEL DEL MONTE | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| TARANTO | 9.500.000 | 1.500.000 | 3.800.000 | | 5.300.000 |
| LOCRI | 13.750.000 | | 6.650.000 | | 6.650.000 |
| SIBARI | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 |
| MELFI - VENOSA | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| NAPOLI-MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE | 14.500.000 | | 3.900.000 | | 3.900.000 |
| L'AQUILA | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTALE | 123.210.000 | 7.500.000 | 73.150.000 | 5.000.000 | 85.650.000 |

* Valore da quadro economico.

La disponibilità di un tale parco progetti, ha contribuito all'avanzamento degli impegni e della spesa del POIn per il triennio 2013-2015 e ad evitarne il parziale definanziamento.

Bandi di gara 1/2

Nel 2013 sono stati pubblicati i primi bandi di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il:

- **Polo di Locri**
Valorizzazione del Museo archeologico Nazionale, del Parco archeologico di Locri Epizefiri e di Palazzo Nieddu del Rio (Museo archeologico della Città di Locri)
- **Polo di Sibari**
 - Nuova unità museale (modulo Ippodameo) e nuovi depositi archeologici
 - Trincee drenanti nell'ambito del Parco del Cavallo e riqualificazione dell'area archeologica
 - Interventi urgenti di salvaguardia e conservazione del parco Archeologico della Sibaritide
 - Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Oasi di Casa Bianca

Bandi di gara 2/2

- **Polo di Castel del Monte**

Opere finalizzate a dotare Castel del Monte degli strumenti essenziali di informazione, comunicazione ed orientamento alla visita e di applicazioni e spazi multimediali

- **Polo di Palermo**


Riqualificazione della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, dell'Oratorio dei Bianchi e di Palazzo Mirto, del Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea – Palazzo Belmonte Riso

- **Polo di Napoli – MANN**

Vanella settentrionale - nuovi depositi temporanei degli imperatori

Avanzamento dell'intervento per la realizzazione della nuova sede del Museo dell'Aquila

Nel 2013 sono proseguite le attività per la realizzazione della nuova sede del Museo Nazionale d'Abruzzo.

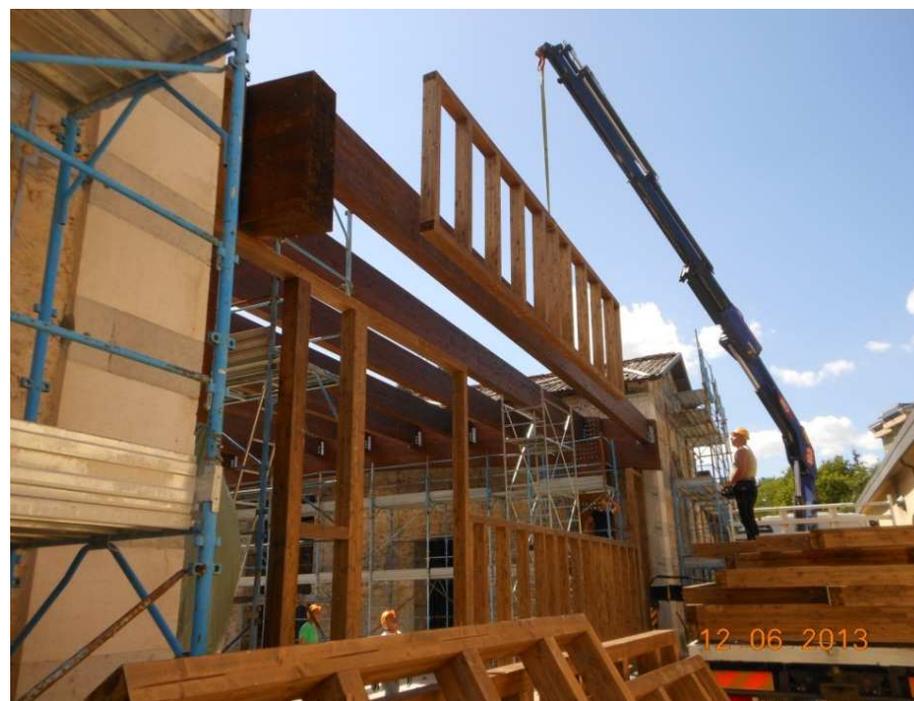

Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2013

Progetti Pilota 1/2

Nel 2013 sono stati attivati i «Progetti Pilota», interventi circoscritti molto significativi ed emblematici in grado di migliorare e razionalizzare l'offerta museale ed archeologica esistente.

Tre i progetti pilota:

1. L'orologio monumentale del MANN

Ripristino, restauro conservativo e valorizzazione dell'orologio monumentale posto sul torrino della facciata principale del MANN e posa in opera di un nuovo orologio da torre automatico.

Progetti Pilota 2/2

2. Note Museali

Messa a punto di un modello di valorizzazione capace di garantire la compatibilità tra le funzioni museali tipiche e quelle di una rappresentazione artistica diversa dai contenuti intrinseci del museo, rispettandone caratteri, vocazioni e identità culturale del luogo.

Alcune delle strutture museali dei Poli Museali diventano così la sede per esecuzioni musicali affidate ad istituzioni di prestigio nazionale.

3. Modelli di gestione

Individuazione e messa in pratica di soluzioni, anche innovative, per la gestione di musei e aree archeologiche.

Il Polo di Melfi-Venosa sarà il luogo per la sperimentazione dell'ipotesi gestionale e possibile modello anche per gli altri Poli museali.
